3033 ZWEI MAINSTEGE
Planungsterminplan Mainsteg 244 MHH + VHH

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen
1				
2	**Mainsteg 244 MHH+VHH**	**947 Tage**	**Mo 01.10.18**	**Di 31.05.22**
3				
4	**Vorbereitung der Vergabe HOAI §42 / §49 LPH6**	**156 Tage**	**Mo 01.10.18**	**Mo 20.05.19**
5	Erstellung und Prüfung Verdingungsunterlagen inkl. Nachtrag Entwurf-AU	156 Tage	Mo 01.10.18	Mo 20.05.19
6				
7	**Vergabevefahren durchführen**	**130 Tage**	**Mo 20.05.19**	**Mo 18.11.19**
8	Ankündigung	0 Tage	Mo 20.05.19	Mo 20.05.19
9	Veröffentlichung	0 Tage	Mo 03.06.19	Mo 03.06.19
10	Angebotsphase + Puffer	40 Tage	Di 04.06.19	Mo 29.07.19
11	Submission	0 Tage	Mo 29.07.19	Mo 29.07.19
12	Auftragsvergabe	0 Tage	Mo 18.11.19	Mo 18.11.19
13				
14	**Mitwirken bei der Vergabe HOAI §42 LPH7**	**80 Tage**	**Di 30.07.19**	**Mo 18.11.19**
15	Zusammenstellung der Angebote	15 Tage	Di 30.07.19	Mo 19.08.19
16	Prüfung und Preisspiegel	20 Tage	Di 20.08.19	Mo 16.09.19
17	Nebenangebote	15 Tage	Di 17.09.19	Mo 07.10.19
18	Bietergespräche	30 Tage	Di 08.10.19	Mo 18.11.19
19				
20	**Ausführung**	**651 Tage**	**Mo 02.12.19**	**Di 31.05.22**
21	Baubeginn	0 Tage	Mo 02.12.19	Mo 02.12.19
22	Ausführung Neubau	370 Tage	Di 03.12.19	Mo 03.05.21
23	Verkehrsübergabe Neubau	0 Tage	Mo 03.05.21	Mo 03.05.21
24	Ausführung Abbruch Bestandsbauwerk	281 Tage	Di 04.05.21	Di 31.05.22

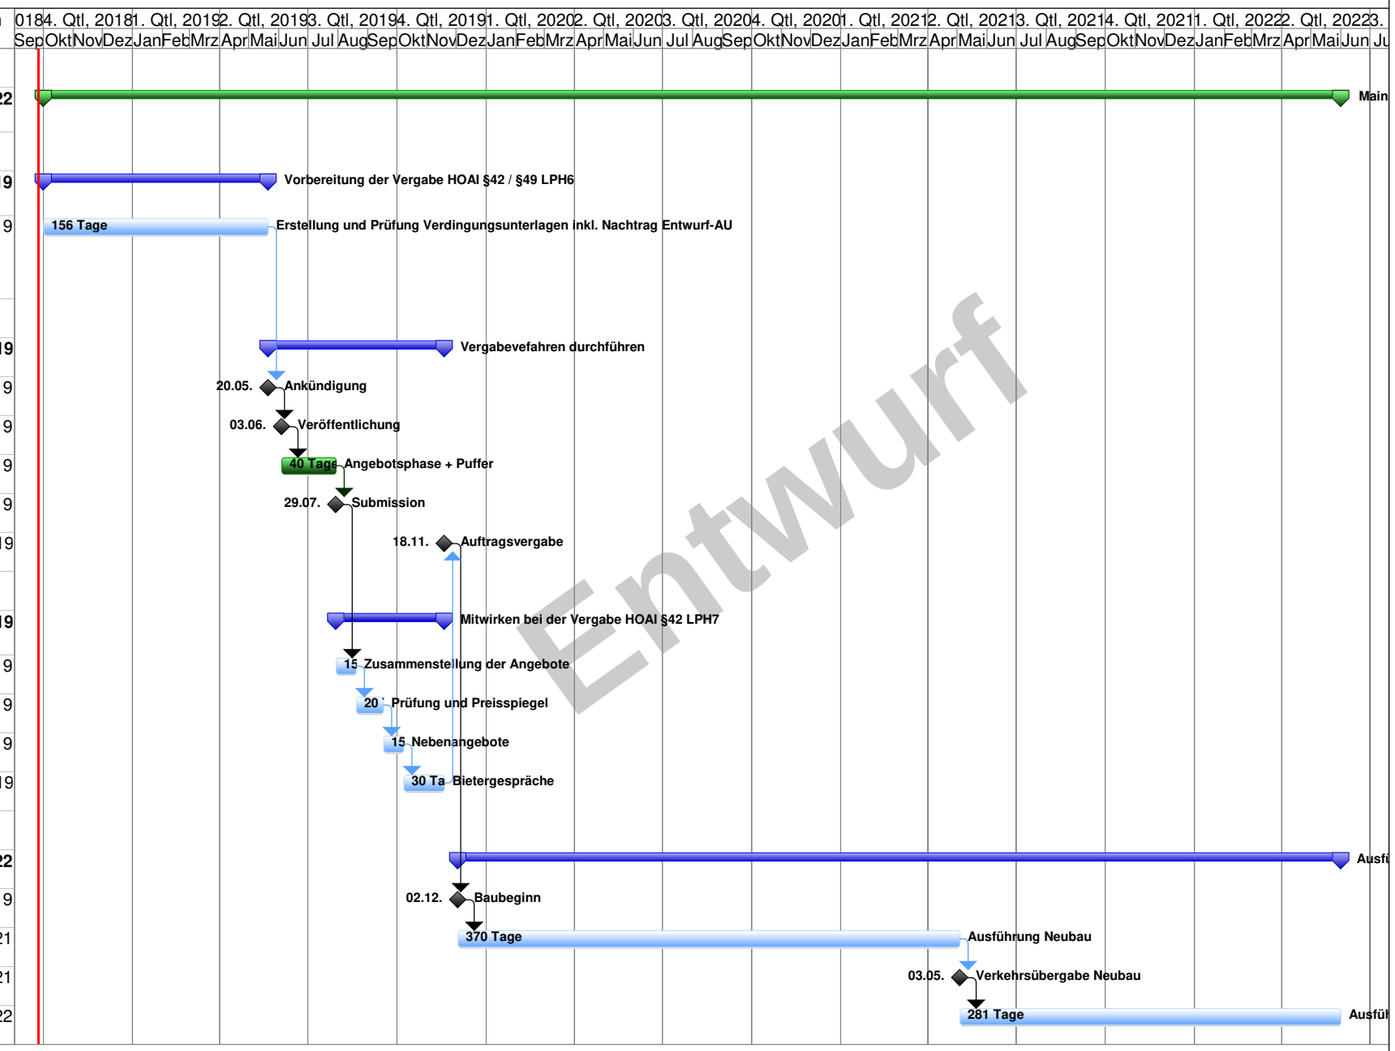

Entwurf
